

DOCUMENTOS DA EMPRESA

CF CONSTRUTORA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

03/2023

Câmara Municipal de Vereadores de Ribeirão

RUA JOÃO PESSOA, 549 - CENTRO - 55.520-000 - Ribeirão/ PE

CMRDJAIRSAANTOSDEALMEIDA@HO

Usuário: Djair Santos de

Chave de Autenticação Digital
1376-1480-009

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 29/11/2023

Sequência: 6012

Sequência estornada:

Empenho: 165/2023

Aviso de liquidação: 6011

Ordem de pagamento:

Órgão orçam.: 10000 - Câmara Municipal de Vereadores

Un. orçam.: 10001 - Câmara Municipal de Vereadores

Despesa: 40 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 85.500,00

Elemento: 51 - Obras e Instalações

Detalhamento: 7 - reforma

Fonte recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

Importa este movimento o valor de: oitenta e cinco mil e quinhentos reais

Credor: 897 - C. F. CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: RUA DR JOSE BEZERRA, S/N - CENTRO

Cidade: Ribeirão - PE

CPF/CNPJ: 14.133.443/0001-65

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 6042

Fone:

CEP: 55.520-000

C/C: 1 817-6

Objeto resumido: VALOR QUE ORA SE EMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONFORME ESTABELECE O REFERIDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA FACHADA, PLENÁRIO E SALA DE CONTABILIDADE DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO RIBEIRÃO/PE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS INERENTES AO EDITAL DO CONVITE Nº. 003/2023.

Conta contábil: 44 - C/C 34.630-6 - CONTA MOVIMENTO

Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: 00612529000045209

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 481 - 28/11/2023	R\$ 113.086,40		

Movimentos Contábeis

Débitos	Créditos
Patrimonial	Patrimonial
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	44 - 1.1.1.1.1.19.02.07 - C/C 34.630-6 - CONTA MOVIMENTO
85.500,00	85.500,00
Orçamentário	Orçamentário
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
85.500,00	85.500,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO
85.500,00	85.500,00
Controle	Controle
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
85.500,00	85.500,00

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

**ATESTAMOS A EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:** CMRDJAIRSAANTOSDEALMEIDA

de Almeida
**REFERENTE A PRESENTE NOTA DE SERVIÇO
E RECIBO.**

Ribeirão - PE, em 29/11/2023

034.252.814-62
Matricula: 04 **CPF nº** 000.000.000-00

Itamar Melo da Silva
Presidente

Pierre Leon C. de Lima
Controlador Interno
CPF/MF 847.182.424-87

Silvio Ferreira da Silva
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA N° 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO -
PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93



Número da Nota:

00000481

Competência:

NOV/2023

Data e Hora Emissão:

28/11/2023 20:57:28

Código de Verificação:

QHDS-UUP52

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

RIBEIRÃO - PE

Local da Prestação:

RIBEIRÃO - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

SIM

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ:

14.133.443/0001-65

Inscrição Municipal:

4993

Nome/Razão Social:

C F CONSTRUTORA EIRELI

Endereço:

DR. JOSÉ BEZERRA ,CENTRO. 302 GALERIA MARIA RITA

Município:

RIBEIRÃO

UF: **PE**

CEP: **55520000**

E-mail:

TEL: **(81)99597-9365**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

11.529.831/0001-71

Inscrição Municipal: **---**

Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social:

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO

Endereço:

RUA JOÃO PESSOA, 549 CENTRO

Município:

RIBEIRÃO

UF: **PE**

CEP: **55520000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.PRESTACAO DE SERVICO #QTD:1 - V.UND.:R\$113.086,40 - TOTAL:R\$113.086,40

CONSTITUICAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DA FACHADA, PLENARIO E SALA DA CONTABILIDADE DO PLEDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE RIBEIRAO/PE

03
MATERIAL 60%
MÃO DE OBRA 40%

DADOS BANCARIOS
AG: 2529-1
C/C: 45209-2
BANCO DO BRASIL
CHAVE PIX CFCONSTRUTORA EIRELI@GMAIL.COM

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 113.086,40

Atividade Prestada:

Código CNAE:

4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

702 - 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
113.086,40	0,00	113.086,40	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- Optante pelo Simples Nacional.

816609379153644

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da



Emissão de comprovantes

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:46
252902529 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO RIBEI

AGENCIA: 2529-1 CONTA: 34.630-6

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2023

NR. DOCUMENTO 612.529.000.045.209

VALOR TOTAL 85.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CF CONSTRUTORA

AGENCIA: 2529-1 CONTA: 45.209-2

NR. DOCUMENTO 612.529.000.034.630

NR. AUTENTICACAO 6.EBA.SDA.F53.F3E.84F

Transação efetuada com sucesso por: JB506929 ITAMAR MELO DA SILVA.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14:06:17
2529102529 0001

Comprovante Fix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO RIBEI
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 34.630-E

SOBRE A TRANSACAO

ID: R0000000020240102160653880791076
CNFJ DO PAGADOR: 11.529.831/0001-71
VALOR: 27.586,40
DATA: 02/01/2024 - 14:06:17

PAGO PARA: Cf Construtora Eireli
CNFJ: 14.133.443/0001-65
CHAVE FIX: Cfconstrutoraeireli@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCB DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2529 - CONTA: 00000000000000452092
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/01/2024 - 14:06:17

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: C.E41.C31.ACS.C64.5AC

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB506929 ITAMAR MELO DA SILVA.

BOLETIM DE MEDICAO 03													
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO - PE													
LOCAL: CAMARA DE VEREADORES DE RIBEIRÃO - PE.													
PROCESSO LICITATÓRIO:006/2023													
CONVITE: 003/2023													
EMPRESA: CF CONSTRUTORA EIRELI ; CNPJ: 14.780.722/0001-10													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	QUANTIDADES		FINANCEIRO		ESTA MEDICAO	ACUMULADO ATUAL	%
							ACUMULADO ANTERIOR	ESTA MEDICAO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATADO			
1			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA	m²	2,25	R\$ 374,27	2,25		842,11	R\$ 842,11	R\$ -	R\$ 842,11	100%
1.2	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	48,83	R\$ 15,64	48,83		763,70	R\$ 763,70	R\$ -	R\$ 763,70	100%
1.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	142	R\$ 24,74	142,00		3513,08	R\$ 3.513,08	R\$ -	R\$ 3.513,08	100%
1.4	C2206	SEINFRA	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	14,26	R\$ 11,16	14,26		159,14	R\$ 159,14	R\$ -	R\$ 159,14	100%
1.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	9,2	R\$ 62,30	9,20		573,16	R\$ 573,16	R\$ -	R\$ 573,16	100%
1.6	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	52,87	R\$ 29,06	52,87		1536,40	R\$ 1.536,40	R\$ -	R\$ 1.536,40	100%
1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,36	R\$ 10,07	3,36		33,84	R\$ 33,84	R\$ -	R\$ 33,84	100%
1.8	4979	ORSE	Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibrocimento 4, 6, ou 8mm	m²	100	R\$ 20,76	0,00	100,00	0,00	R\$ 2.076,00	R\$ 2.076,00	R\$ 2.076,00	100%
1.9	1859	ORSE	Revisão de esquadria de ferro	m²	20	R\$ 181,80	20,00		3636,00	R\$ 3.636,00	R\$ -	R\$ 3.636,00	100%
1.10	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	20,89	R\$ 3,61	20,89		75,41	R\$ 75,41	R\$ -	R\$ 75,41	100%
1.11	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352	R\$ 65,13	224,15	127,85	14598,91	R\$ 22.925,76	R\$ 8.326,85	R\$ 22.925,76	100%
1.12	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88	R\$ 140,51	75,04	12,96	10544,48	R\$ 12.364,88	R\$ 1.820,40	R\$ 12.364,88	100%
1.13	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	46,73	R\$ 5,44	46,73		254,21	R\$ 254,21	R\$ -	R\$ 254,21	100%
2			INFRAESTRUTURA										
2.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	15	R\$ 93,74	15,00		1406,10	R\$ 1.406,10	R\$ -	R\$ 1.406,10	100%
2.2	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	20,54	R\$ 56,77	20,54		1166,06	R\$ 1.166,06	R\$ -	R\$ 1.166,06	100%
3			REVESTIMENTO										
3.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	173,53	R\$ 5,51	173,53		956,15	R\$ 956,15	R\$ -	R\$ 956,15	100%



3.2	104246	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	171,16	R\$	84,41	101,88	69,28	171,16	R\$	14.447,62	8600,00	R\$	5.847,62	R\$	14.447,62	100%
3.3	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2022	m²	0,32	R\$	920,20	0,32		0,32	R\$	294,46	294,46	R\$	-	R\$	294,46	100%
3.4	9605	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha travertino navona, crema, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	240,69	R\$	238,54	80,59	160,10	240,69	R\$	56.932,81	19061,60	R\$	37.871,21	R\$	56.932,81	100%
3.5	8928	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	19,5	R\$	84,11	19,50		19,50	R\$	1.640,15	1640,15	R\$	-	R\$	1.640,15	100%
3.6	12418	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha celim branco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	23	R\$	122,85	22,00	1,00	23,00	R\$	2.825,55	2702,70	R\$	122,85	R\$	2.825,55	100%
3.7	COTAÇÃO 1	Próprio	RODAMEIO AUTOCOLANTE DE 2,3 CM COM 10 METROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20	R\$	187,94	15,00	5,00	20,00	R\$	3.758,80	2819,10	R\$	939,70	R\$	3.758,80	100%
3.8	12442	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03	m²	12	R\$	275,77	12,00		12,00	R\$	3.309,24	3309,24	R\$	-	R\$	3.309,24	100%
4			PISO															
4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	81,6	R\$	37,29	81,60		81,60	R\$	3.042,86	3042,86	R\$	-	R\$	3.042,86	100%
4.2	98682	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	81,6	R\$	52,80	81,60		81,60	R\$	4.308,48	4308,48	R\$	-	R\$	4.308,48	100%
4.3	C4865	SEINFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E = 5cm SOBRE LEITO DE SECAGEM	m²	15,24	R\$	59,68	0,00	15,24	15,24	R\$	909,52	0,00	R\$	909,52	R\$	909,52	100%
4.4	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	60	R\$	344,65	8,12	51,88	60,00	R\$	20.879,00	2800,01	R\$	17.878,99	R\$	20.879,00	100%
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															
5.1	3395	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embuido Ø 3/4"	un	34	R\$	325,09	28,00	6,00	34,00	R\$	11.053,06	9102,52	R\$	1.950,54	R\$	11.053,06	100%
5.2	13178	ORSE	Arandela uso externo lâmpada Led 18W G-light ou similar	un	4	R\$	83,34	4,00		4,00	R\$	333,36	333,36	R\$	-	R\$	333,36	100%



5.3	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embulir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (lto 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	23	R\$	256,38	16,00	7,00	23,00	R\$	5.896,74	4102,08	R\$	1.794,66	R\$	5.896,74	100%
5.4	3278	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	4	R\$	233,49	4,00		4,00	R\$	933,96	933,96	R\$	-	R\$	933,96	100%
5.5	789	ORSE	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada	un	3	R\$	194,20	3,00		3,00	R\$	582,60	582,60	R\$	-	R\$	582,60	100%
5.6	12657	ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	2	R\$	28,69	2,00		2,00	R\$	57,38	57,38	R\$	-	R\$	57,38	100%
5.7	3397	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	4	R\$	305,35	4,00		4,00	R\$	1.221,40	1.221,40	R\$	-	R\$	1.221,40	100%
5.8	627	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	18	R\$	24,57	18,00		18,00	R\$	442,26	442,26	R\$	-	R\$	442,26	100%
5.9	97590	SINAPI	LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30	R\$	111,55	21,00	9,00	30,00	R\$	3.346,50	2342,55	R\$	1.003,95	R\$	3.346,50	100%
5.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	R\$	4,65	300,00		300,00	R\$	1.395,00	1.395,00	R\$	-	R\$	1.395,00	100%
5.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150	R\$	7,21	150,00		150,00	R\$	1.081,50	1.081,50	R\$	-	R\$	1.081,50	100%
6			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS															
6.1	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40x40x60cm) DE 1 TJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1	R\$	558,81	0,00	1,00	1,00	R\$	558,81	0,00	R\$	558,81	R\$	558,81	100%
6.2	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	3	R\$	46,63	3,00		3,00	R\$	139,89	139,89	R\$	-	R\$	139,89	100%
6.3	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10	R\$	159,08	0,00	10,00	10,00	R\$	1.590,80	0,00	R\$	1.590,80	R\$	1.590,80	100%
7			COBERTURA E FORRO															
7.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017 PS	m²	43,73	R\$	48,65	43,73		43,73	R\$	2.127,46	2.127,46	R\$	-	R\$	2.127,46	100%
7.2	C4284	SEINFRA	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	125,76	R\$	18,35	125,76		125,76	R\$	2.307,70	2.307,70	R\$	-	R\$	2.307,70	100%
7.3	2758	ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm m2	m²	30,39	R\$	17,65	0,00	30,39	30,39	R\$	536,38	0,00	R\$	536,38	R\$	536,38	100%
7.4	C1458	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	m²	100	R\$	68,06	80,00	20,00	100,00	R\$	6.806,00	5444,80	R\$	1.361,20	R\$	6.806,00	100%



[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Sítio do Pica-Pau
Casa "José Gaudêncio"



10.3	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	5	R\$ 23,13	0,00	5,00	5,00	R\$ 115,65	0,00	R\$ 115,65	R\$ 115,65	100%
11	97064 SINAPI	DIVERSOS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	136	R\$ 24,71	110,70	25,30	136,00	R\$ 3.360,56	2735,50	R\$ 625,06	R\$ 3.360,56	100%
11.2	C0083 SEINFRA	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	m²	480	R\$ 7,50	390,00	90,00	480,00	R\$ 3.600,00	2925,00	R\$ 675,00	R\$ 3.600,00	100%
12		SERVIÇOS FINAIS											
12.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	150	R\$ 2,85	0,00	150,00	150,00	R\$ 427,50	0,00	R\$ 427,50	R\$ 427,50	100%
				R\$ 265.008,75 R\$ 151.922,35 R\$ 113.086,40 R\$ 265.008,85									

RIBEIRÃO, 27 DE NOVEMBRO DE 2023


CF CONSTRUTORA EIRELI

ARTHUR VASCONCELOS D'GOSIS
CREA 1820360440 PE


Álbum de Fotos Geral

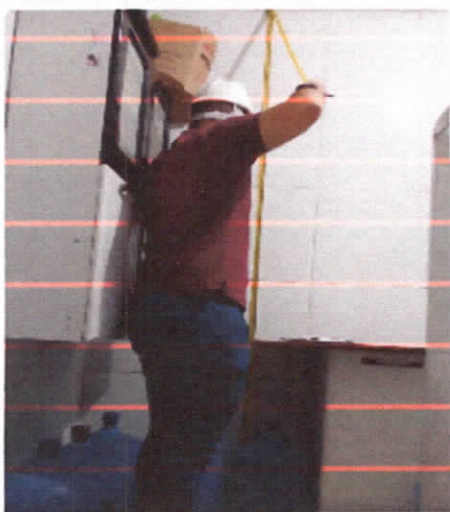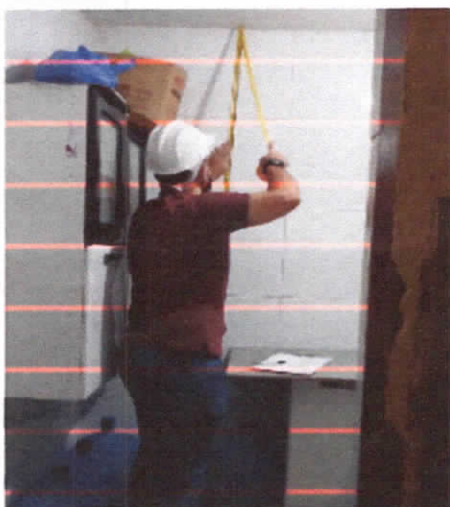

Álbum de Fotos Geral

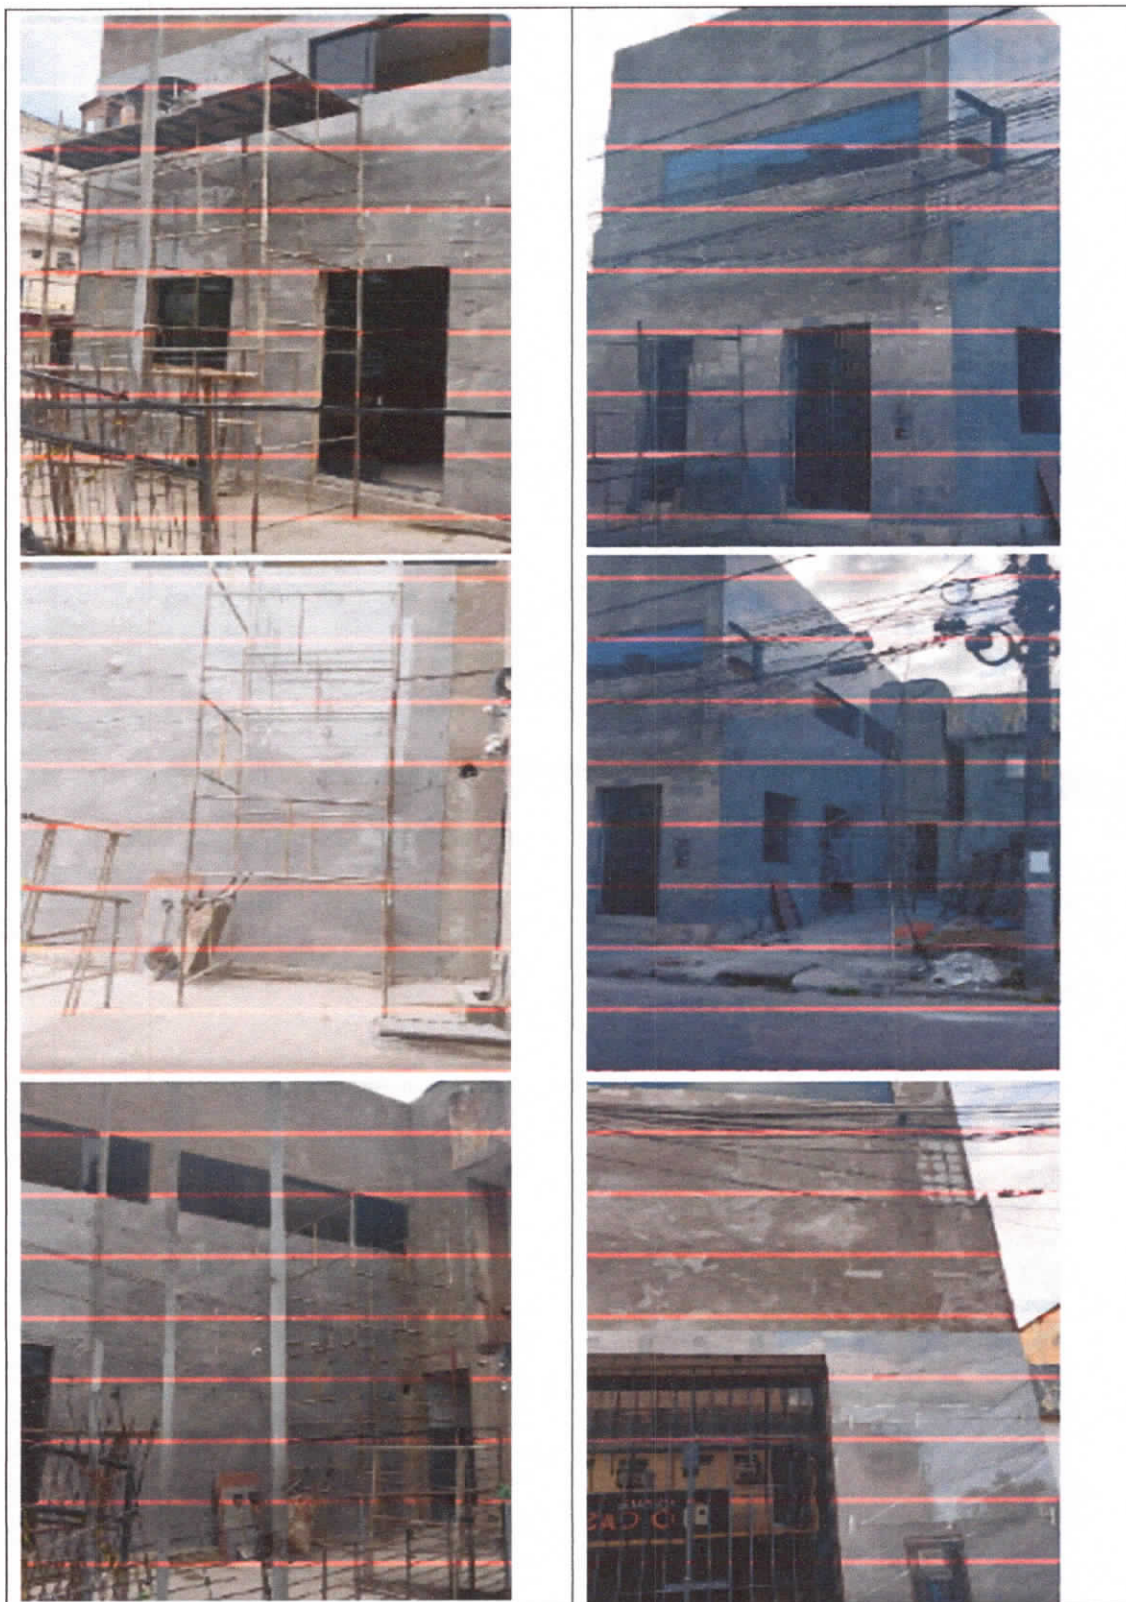

Álbum de Fotos Geral

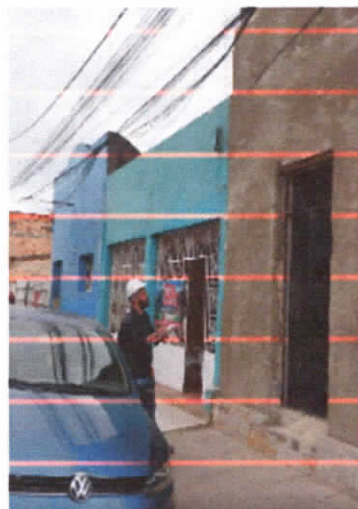

CF
construtora -
Obras Serviços e Locações



CF
construtora -
Obras Serviços e Locações



CF
construtora -
Obras Serviços e Locações



CF
construtora -
Obras Serviços e Locações



CF
construtora -
Obras Serviços e Locações



CF
construtora -
Obras Serviços e Locações



CF
construtora -
Obras Serviços e Locações



CF
construtora -
Obras Serviços e Locações



