

**DOCUMENTOS EMPRESA CF
CONSTRUTORA**

**RELATIVO MEDIÇÃO BM 02
27/10/2023**

Câmara Municipal de Vereadores de Ribeirão

RUA JOÃO PESSOA, 549 - CENTRO - 55.520-000 - Ribeirão/ PE

CMRDJAIRSAANTOSDEALMEIDA@HO

Usuário: Djair Santos de

Chave de Autenticação Digital
2107-7067-525

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 27/10/2023

Sequência: 5798

Sequência estornada:

Empenho: 165/2023

Aviso de liquidação: 5797

Ordem de pagamento:

Órgão orçam.: 10000 - Câmara Municipal de Vereadores

Un. orçam.: 10001 - Câmara Municipal de Vereadores

Despesa: 40 - Aplicações Diretas

Elemento: 51 - Obras e Instalações

Detalhamento: 7 - reforma

Valor: R\$ 71.695,20

Fonte recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó:

Importa este movimento o valor de: setenta e um mil e seiscientos e noventa e cinco reais e vinte centavos

Credor: 897 - C. F. CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: RUA DR JOSE BEZERRA, S/N - CENTRO

Cidade: Ribeirão - PE

CPF/CNPJ: 14.133.443/0001-65

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 6042

Fone:

CEP: 55.520-000

C/C: 1 817-6

Objeto resumido: VALOR QUE ORA SE EMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONFORME ESTABELECE O REFERIDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA FACHADA, PLENÁRIO E SALA DE CONTABILIDADE DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO RIBEIRÃO/PE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS INERENTES AO EDITAL DO CONVITE Nº. 003/2023.

Conta contábil: 44 - C/C 34.630-6 - CONTA MOVIMENTO

Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: 612529000045209

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 479 - 27/10/2023	R\$ 71.695,20		

Movimentos Contábeis

Débitos	Créditos
Patrimonial	Patrimonial
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	44 - 1.1.1.1.1.19.02.07 - C/C 34.630-6 - CONTA MOVIMENTO
71.695,20	71.695,20
Orçamentário	Orçamentário
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
71.695,20	71.695,20
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO
71.695,20	71.695,20
Controle	Controle
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
71.695,20	71.695,20

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

ATESTAMOS A EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS: Reforma da
Fachada e outros conf. contrato
REFERENTE A PRESENTE NOTA DE SERVIÇO
E RECIBO.
Ribeirão - PE, em 27/10/2023
Matrícula: 04 CPF nº 834232844-5

Silvio Ferreira da Silva
Tesoreroiro

Itamar Melo da Silva
Presidente

Djair Santos de Almeida
CRO/PE Nº 021977/0-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA N° 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO -
PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93



Número da Nota:

00000479

Competência:

OUT/2023

Data e Hora Emissão:

27/10/2023 08:25:06

Código de Verificação:

NTDB-EGRF2

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

RIBEIRÃO - PE

Local da Prestação:

RIBEIRÃO - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

SIM

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ:

14.133.443/0001-65

Inscrição Municipal:

4993

Nome/Razão Social:

C F CONSTRUTORA EIRELI

Endereço:

RUA DR. JOSÉ BEZERRA ,CENTRO. 302 GALERIA MARIA RITA

Município:

RIBEIRÃO

UF:

PE

CEP: **55520000**

E-mail:

cfconstrutoraereili@gmail.com

TEL: **8187323939**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

11.529.831/0001-71

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO

Endereço:

RUA JOÃO PESSOA, 549 CENTRO

Município:

RIBEIRÃO

UF:

PE

CEP: **55520000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.PRESTACCAO DE SERVICO #QTD:1 - V.UND.:R\$71.695,20 - TOTAL.:R\$71.695,20

1. PRESTACCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DA FACHADA , PLENARIO E SALA DA CONTABILIDADE DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO

MATERIAL 60%
MAO DE OBRA 40%

DADOS BANCARIOS
AG:25291
C/C: 45209-2
BANCO DO BRASIL
CHAVE PIX CFCONSTRUTORAEREILI@GMAIL.COM

Djair Santos de Almeida
CRC/PE Nº 02197710-7

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 71.695,20

Atividade Prestada:

Código CNAE:

4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

702 - 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
71.695,20	0,00	71.695,20	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- Optante pelo Simples Nacional.

37512302375268

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão 2023.000004670163-40

Data de Emissão 02/08/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ 13.443/0001-65

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não caracteriza o contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **30/10/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

É inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

Marli Sampaio de Almeida
CRC/PE 02197770-7

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.133.443/0001-65

Razão

Social:

C F DA SILVA CONSTRUTORA RIBEIRAO LTDA ME

Endereço:

RUA DR JOSE BEZERRA 302 PRIMEIRO ANDAR ED M / RIBEIRAO /
RIBEIRAO / PE / 55520-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/10/2023 a 30/10/2023

Certificação Número: 2023100101024741310595

Informação obtida em 16/10/2023 18:58:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br


Djair Santos de Almeida
CRC/PE N° 021977/0-7

BOLETIM DE MEDIÇÃO BM2

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO - PE						CONTRATADO						R\$ 285.008,79		
LOCAL: CAMARA DE VEREADORES DE RIBEIRÃO - PE.						MEDIDO NO BM 01						R\$ 80.227,18		
PROCESSO LICITATORIO:006/2023						MEDIDO NO BM 02						R\$ 71.898,20		
CONVITE: 003/2023						SALDO						R\$ 113.084,40		
EMPRESA: CF CONSTRUTORA EIRELI ; CNPJ: 14.786.722/0001-10														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	QUANTIDADES			FINANCEIRO			ACUMULADO ATUAL	%
							ACUMULADO ANTERIOR	ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA MEDIÇÃO		
SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE	m²	2,25	R\$ 374,27	0,00	2,25	2,25	R\$ 842,11	0,00	R\$ 842,11	R\$ 842,11	100%
1.2	C1084	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	48,83	R\$ 15,84	48,83		48,83	R\$ 763,70	763,70	R\$ -	R\$ 763,70	100%
1.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	142	R\$ 24,74	142,00		142,00	R\$ 3.513,08	3513,08	R\$ -	R\$ 3.513,08	100%
1.4	C2206	SEINFRA	RETIRODA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	14,26	R\$ 11,16	14,26		14,26	R\$ 159,14	159,14	R\$ -	R\$ 159,14	100%
1.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9,2	R\$ 62,30	9,20		9,20	R\$ 573,18	573,18	R\$ -	R\$ 573,18	100%
1.6	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	52,87	R\$ 29,06	52,87		52,87	R\$ 1.536,40	1536,40	R\$ -	R\$ 1.536,40	100%
1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,36	R\$ 10,07	3,36		3,36	R\$ 33,84	33,84	R\$ -	R\$ 33,84	100%
1.8	4979	ORSE	Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibrocimento 4, 6, ou 8mm	m²	100	R\$ 20,78	0,00		0,00	R\$ 2.076,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0%
1.9	1859	ORSE	Revisão de esquadria de ferro	m²	20	R\$ 181,80	20,00		20,00	R\$ 3.636,00	3636,00	R\$ -	R\$ 3.636,00	100%
1.10	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	20,89	R\$ 3,61	20,89		20,89	R\$ 75,41	75,41	R\$ -	R\$ 75,41	100%
1.11	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352	R\$ 65,13	95,00	129,15	224,15	R\$ 22.925,76	6187,35	R\$ 8.411,56	R\$ 14.598,91	64%
1.12	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88	R\$ 140,51	48,00	27,04	75,04	R\$ 12.364,88	6744,48	R\$ 3.800,00	R\$ 10.544,48	85%
1.13	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	46,73	R\$ 5,44	46,73		46,73	R\$ 254,21	254,21	R\$ -	R\$ 254,21	100%
INFRAESTRUTURA														
2.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	15	R\$ 93,74	15,00		15,00	R\$ 1.406,10	1406,10	R\$ -	R\$ 1.406,10	100%
2.2	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	20,54	R\$ 56,77	20,54		20,54	R\$ 1.166,06	1166,06	R\$ -	R\$ 1.166,06	100%
REVESTIMENTO														
3.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	173,53	R\$ 5,51	0,00	173,53	173,53	R\$ 956,15	0,00	R\$ 956,15	R\$ 956,15	100%
3.2	104246	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	171,16	R\$ 84,41	0,00	101,88	101,88	R\$ 14.447,62	0,00	R\$ 8.600,00	R\$ 8.600,00	60%
3.3	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOCORRASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m²	0,32	R\$ 820,20	0,32		0,32	R\$ 294,40	294,40	R\$ -	R\$ 294,40	100%
3.4	9605	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha travertino navona, crema, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	240,69	R\$ 236,54	40,00	40,59	80,59	R\$ 56.932,81	9461,60	R\$ 9.600,00	R\$ 19.061,60	33%
3.5	8928	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	19,5	R\$ 84,11	0,00	19,50	19,50	R\$ 1.640,15	0,00	R\$ 1.640,15	R\$ 1.640,15	100%
3.6	12418	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim branco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	23	R\$ 122,85	15,00	7,00	22,00	R\$ 2.825,55	1842,75	R\$ 859,95	R\$ 2.702,70	96%
COTAÇÃO 1	Próprio		RODAMEIO AUTOCOLANTE DE 2,3 CM COM 10 METROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20	R\$ 187,94	10,00	5,00	15,00	R\$ 3.758,80	1879,40	R\$ 939,70	R\$ 2.819,10	76%
	12442	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha murari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03	m²	12	R\$ 275,77	12,00		12,00	R\$ 3.309,24	3309,24	R\$ -	R\$ 3.309,24	100%
PISO														
4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	81,6	R\$ 37,29	0,00	81,60	81,60	R\$ 3.042,86	0,00	R\$ 3.042,86	R\$ 3.042,86	100%
4.2	98682	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	81,6	R\$ 52,80	0,00	81,60	81,60	R\$ 4.308,48	0,00	R\$ 4.308,48	R\$ 4.308,48	100%
4.3	C4865	SEINFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E = 5cm SOBRE LEITO DE SECAGEM	m²	15,24	R\$ 59,68	0,00		0,00	R\$ 909,52	0,00	R\$ -	R\$ -	0%
4.4	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	60	R\$ 344,65	0,00	8,12	8,12	R\$ 20.679,00	0,00	R\$ 2.800,01	R\$ 2.800,01	14%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
5.1	3395	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	34	R\$ 325,09	10,00	18,00	28,00	R\$ 11.053,06	3250,90	R\$ 5.851,82	R\$ 9.102,52	82%
5.2	13178	ORSE	Arandela uso externo lâmpada Led 18W G-light ou similar	un	4	R\$ 83,34	4,00		4,00	R\$ 333,36	333,36	R\$ -	R\$ 333,36	100%
5.3	3296	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	23	R\$ 256,38	5,00	11,00	16,00	R\$ 5.896,74	1281,90	R\$ 2.820,18	R\$ 4.102,08	70%
5.4	3278	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	4	R\$ 233,49	4,00		4,00	R\$ 933,96	933,96	R\$ -	R\$ 933,96	100%
5.5	789	ORSE	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada	un	3	R\$ 194,20	3,00		3,00	R\$ 582,60	582,60	R\$ -	R\$ 582,60	100%
5.6	12657	ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	2	R\$ 28,89	2,00		2,00	R\$ 57,38	57,38	R\$ -	R\$ 57,38	100%



Câmara Municipal de Ribeirão
Para "Jus Cuiusque"

5.7	3397	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	4	R\$ 305,35	4,00	4,00	R\$ 1.221,40	1221,40	R\$	R\$ 1.221,40	100%
5.8	627	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	18	R\$ 24,57	18,00	18,00	R\$ 442,26	442,26	R\$	R\$ 442,26	100%
5.9	97590	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30	R\$ 111,55	15,00	6,00 21,00	R\$ 3.346,50	1673,25	R\$ 669,30	R\$ 2.342,55	70%
5.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	R\$ 4,65	300,00	300,00	R\$ 1.395,00	1395,00	R\$	R\$ 1.395,00	100%
5.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150	R\$ 7,21	150,00	150,00	R\$ 1.081,50	1081,50	R\$	R\$ 1.081,50	100%
6			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
6.1	C0524	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TUJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1	R\$ 558,81	0,00	0,00	R\$ 558,81	0,00	R\$	R\$	0%
6.2	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	3	R\$ 48,63	0,00	3,00 3,00	R\$ 139,89	0,00	R\$ 139,89	R\$ 139,89	100%
6.3	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10	R\$ 159,08	0,00	0,00	R\$ 1.590,80	0,00	R\$	R\$	0%
7			COBERTURA E FORRO										
7.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	43,73	R\$ 48,65	43,73	43,73	R\$ 2.127,46	2127,46	R\$	R\$ 2.127,46	100%
7.2	C4284	SEINFRA	BANCA DE GESSO PI FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	125,76	R\$ 18,35	125,76	125,76	R\$ 2.307,70	2307,70	R\$	R\$ 2.307,70	100%
7.3	2758	ORSE	Teia de nylon, fio 30-36 (3,8mm), malha 10x10cm m2	m²	30,38	R\$ 17,65	0,00	0,00	R\$ 536,33	0,00	R\$	R\$	0%
	C1458	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	m²	100	R\$ 68,06	80,00	80,00	R\$ 6.806,00	5444,80	R\$	R\$ 5.444,80	80%
7.5	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	30	R\$ 138,96	0,00	0,00	R\$ 4.168,80	0,00	R\$	R\$	0%
7.6	87411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALUSCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 0,5CM. AF_03/2023	m²	118,88	R\$ 17,72	118,88	118,88	R\$ 2.106,55	2106,55	R\$	R\$ 2.106,55	100%
8			ESQUADRIAS										
8.1	COMPOSIÇÃO 1 - CAMARA	Própria	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM (2,65 X 2,00)	UN	1	R\$ 5.239,76	0,00	0,00	R\$ 5.239,76	0,00	R\$	R\$	0%
8.2	COMPOSIÇÃO 2 - CAMARA	Própria	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM (2,10 X 1,60)	UN	1	R\$ 4.373,35	1,00	1,00	R\$ 4.373,35	4373,35	R\$	R\$ 4.373,35	100%
8.3	COMPOSIÇÃO 3 - CAMARA	Própria	JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM (1,50 x 1,65)	UN	2	R\$ 1.191,66	0,00	0,00	R\$ 2.383,32	0,00	R\$	R\$	0%
8.4	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,65	R\$ 810,69	0,00	0,00	R\$ 3.769,71	0,00	R\$	R\$	0%
8.5	C1968	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	m²	1,44	R\$ 478,39	0,00	0,00	R\$ 688,00	0,00	R\$	R\$	0%
8.6	99841	SINAPI	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	6,5	R\$ 1.100,93	0,00	4,68 4,68	R\$ 7.156,05	0,00	R\$ 5.156,76	R\$ 5.156,76	72%
8.7	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	11	R\$ 100,86	0,00	0,00	R\$ 1.107,56	0,00	R\$	R\$	0%
9			PINTURA										
9.1	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	213,59	R\$ 32,91	80,00	103,20 183,20	R\$ 7.029,25	2632,80	R\$ 3.396,44	R\$ 6.029,24	86%
9.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	136,94	R\$ 18,01	80,00	80,00	R\$ 2.466,25	1440,80	R\$	R\$ 1.440,80	58%
9.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	m²	213,59	R\$ 16,95	70,00	117,99 187,99	R\$ 3.620,35	1186,50	R\$ 2.000,00	R\$ 3.186,50	88%
9.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	m²	326,2	R\$ 14,46	80,00	177,04 257,04	R\$ 4.716,85	1156,80	R\$ 2.560,05	R\$ 3.716,85	79%
9.5	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF_01/2021	m²	32,88	R\$ 19,43	0,00	0,00	R\$ 638,86	0,00	R\$	R\$	0%
10			PAISAGISMO										
10.1	C0380	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	2	R\$ 1.118,37	0,00	0,00	R\$ 2.236,74	0,00	R\$	R\$	0%
10.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE C/ESTRUTURA COM ALTO DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	7	R\$ 137,77	0,00	0,00	R\$ 964,39	0,00	R\$	R\$	0%
10.3	103948	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	5	R\$ 23,13	0,00	0,00	R\$ 115,65	0,00	R\$	R\$	0%
11			DIVERSOS										
11.1	97084	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	136	R\$ 24,71	50,00	60,70 110,70	R\$ 3.360,56	1235,50	R\$ 1.500,00	R\$ 2.735,56	81%
11.2	C0083	SEINFRA	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	m²	480	R\$ 7,50	150,00	240,00 390,00	R\$ 3.600,00	1125,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.925,00	81%
12			SERVIÇOS FINAIS										
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	150	R\$ 2,85	0,00	0,00	R\$ 427,50	0,00	R\$	R\$	0%

R\$ 265.006,75 R\$ 80.227,15 R\$ 71.696,20 R\$ 151.922,35

Ribeirão, 26 de Outubro de 2023.

CF CONSTRUTORA EIRELI
14.133.443/0001-65

ARTHUR VASCONCELOS D'ÁGOSTINI
CREA 18203604-4/PE




Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM II EM 26/10/2023
PROCESSO 05/2023 CONVITE 03/2023



Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM II EM 26/10/2023
PROCESSO 05/2023 CONVITE 03/2023

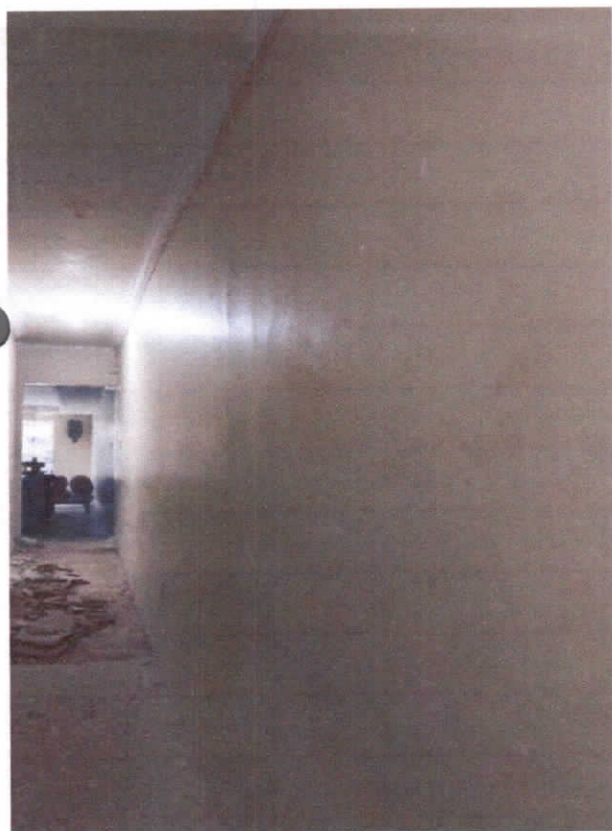

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM II EM 26/10/2023
PROCESSO 05/2023 CONVITE 03/2023



Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65


QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM II EM 26/10/2023
PROCESSO 05/2023 CONVITE 03/2023

FOTOS DA REMOÇÃO DO PISO DO CORREDOR



Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM II EM 26/10/2023
PROCESSO 05/2023 CONVITE 03/2023

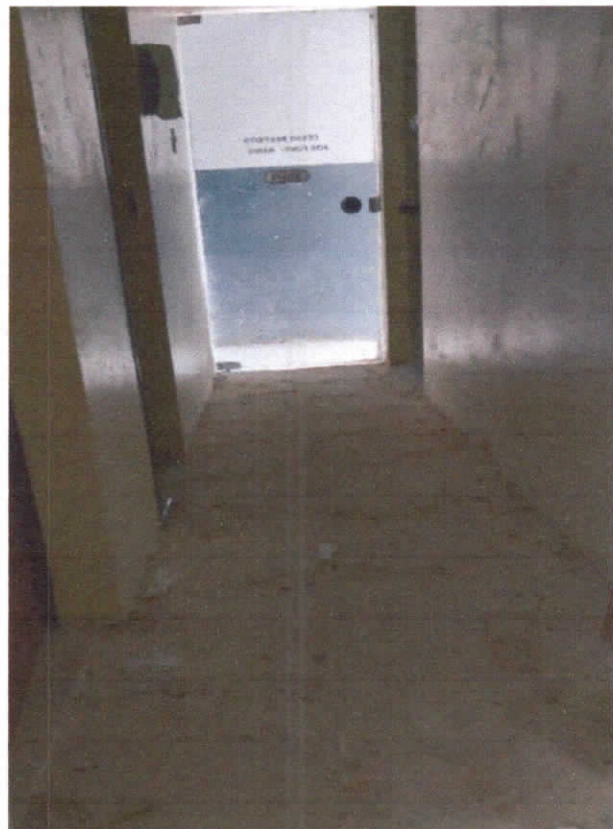

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM II EM 26/10/2023
PROCESSO 05/2023 CONVITE 03/2023



Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65


QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM II EM 26/10/2023
PROCESSO 05/2023 CONVITE 03/2023



Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM II EM 26/10/2023
PROCESSO 05/2023 CONVITE 03/2023

FOTOS DA REMOÇÃO DO PISO DO CORREDOR

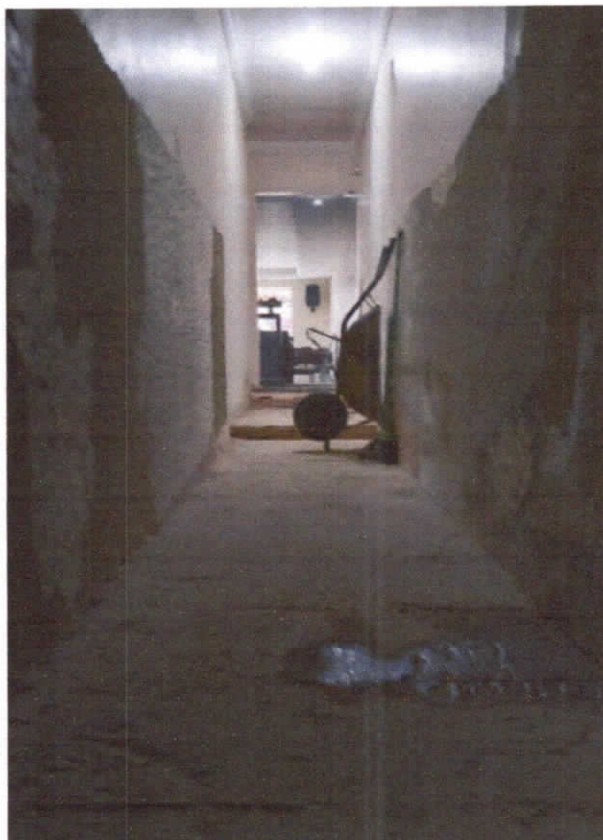

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM II EM 26/10/2023
PROCESSO 05/2023 CONVITE 03/2023



Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM II EM 26/10/2023
PROCESSO 05/2023 CONVITE 03/2023



Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65


QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM II EM 26/10/2023
PROCESSO 05/2023 CONVITE 03/2023



Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM II EM 26/10/2023
PROCESSO 05/2023 CONVITE 03/2023

FOTOS DA REMOÇÃO DO PISO DO CORREDOR

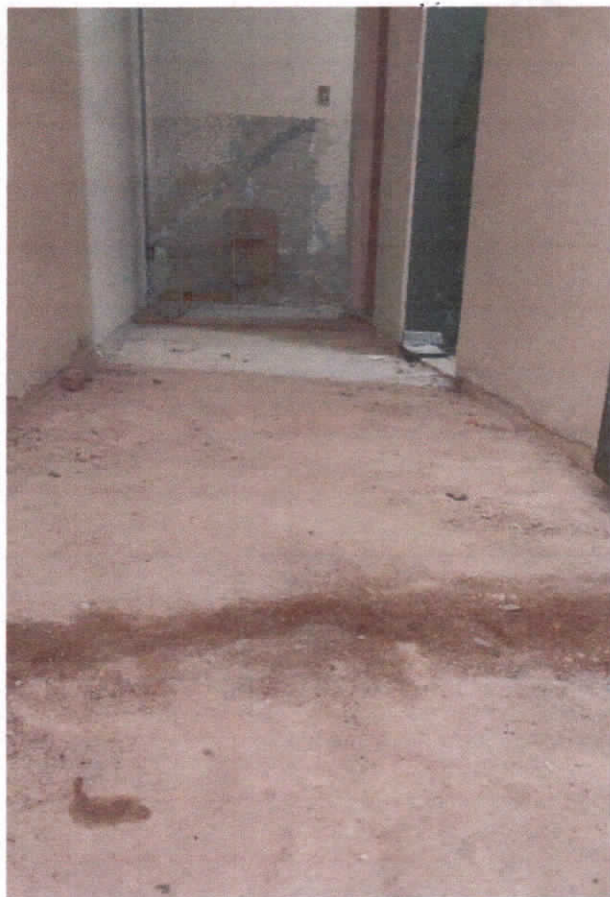

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65


QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)

FOTOS DA REMOÇÃO DO PISO DO CORREDOR

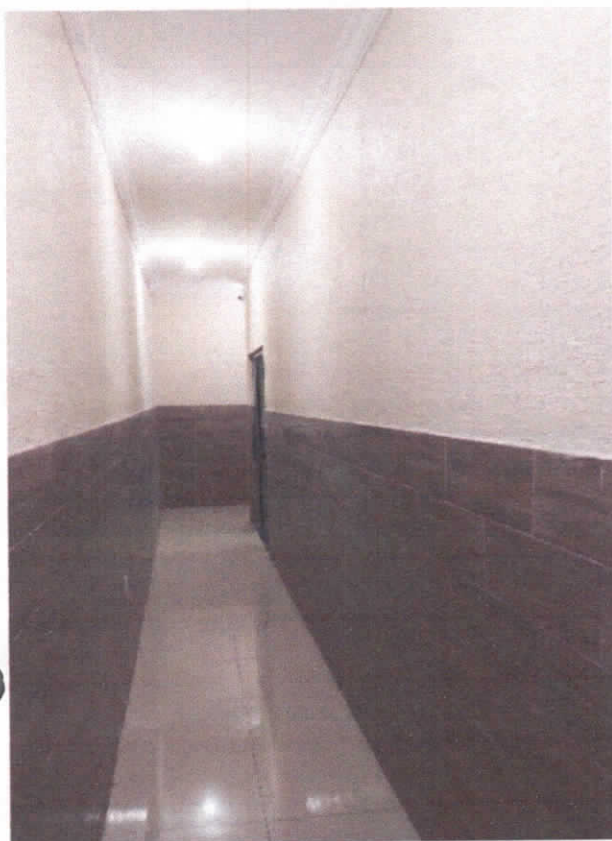

CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65


QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)

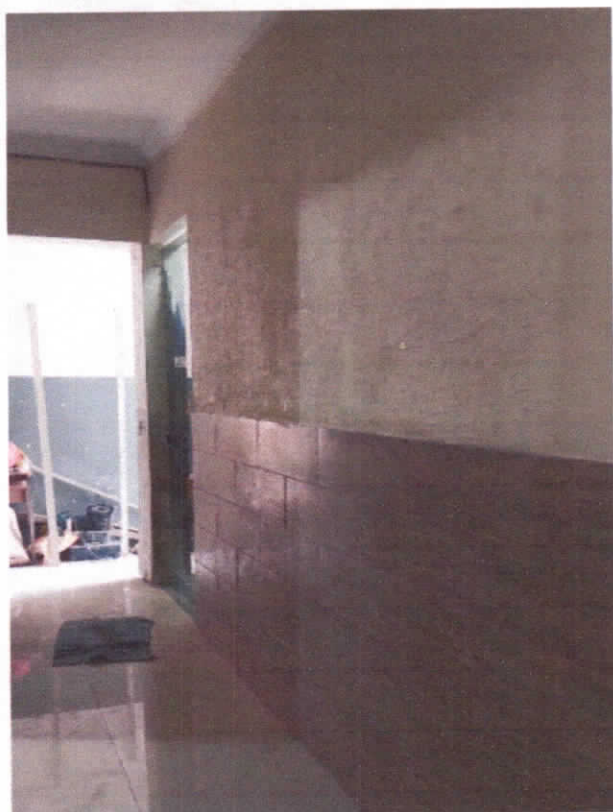

CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)

FOTOS DA APLICAÇÃO PORCELANATO DO PISO E PAREDES DO CORREDOR



Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)

FOTOS DE REMOÇÃO DO CERÂMICA/REBOCO E CHAPISCO COM REBOCO FACHADA



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



Emissão de comprovantes

27/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:27:45
252902529 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO RIBEI
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 34.630-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/10/2023
NR. DOCUMENTO	612.529.000.045.209
VALOR TOTAL	71.695,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CF CONSTRUTORA
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 45.209-2
NR. DOCUMENTO 612.529.000.034.630
=====

NR. AUTENTICACAO	F.EBF.257.193.67F.E10
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB506929 ITAMAR MELO DA SILVA
